

Будгенплан на будівництво підземної частини

Місце для палиння

КН

Тимчасовий туалет

Побутові приміщення

фасад

відрізів


погріб зруйнов.

Тимчасовий проїзд із збірних залізобетонних плит

відрізів


Тимчасові ворота

ПГ-2 (існуючий)

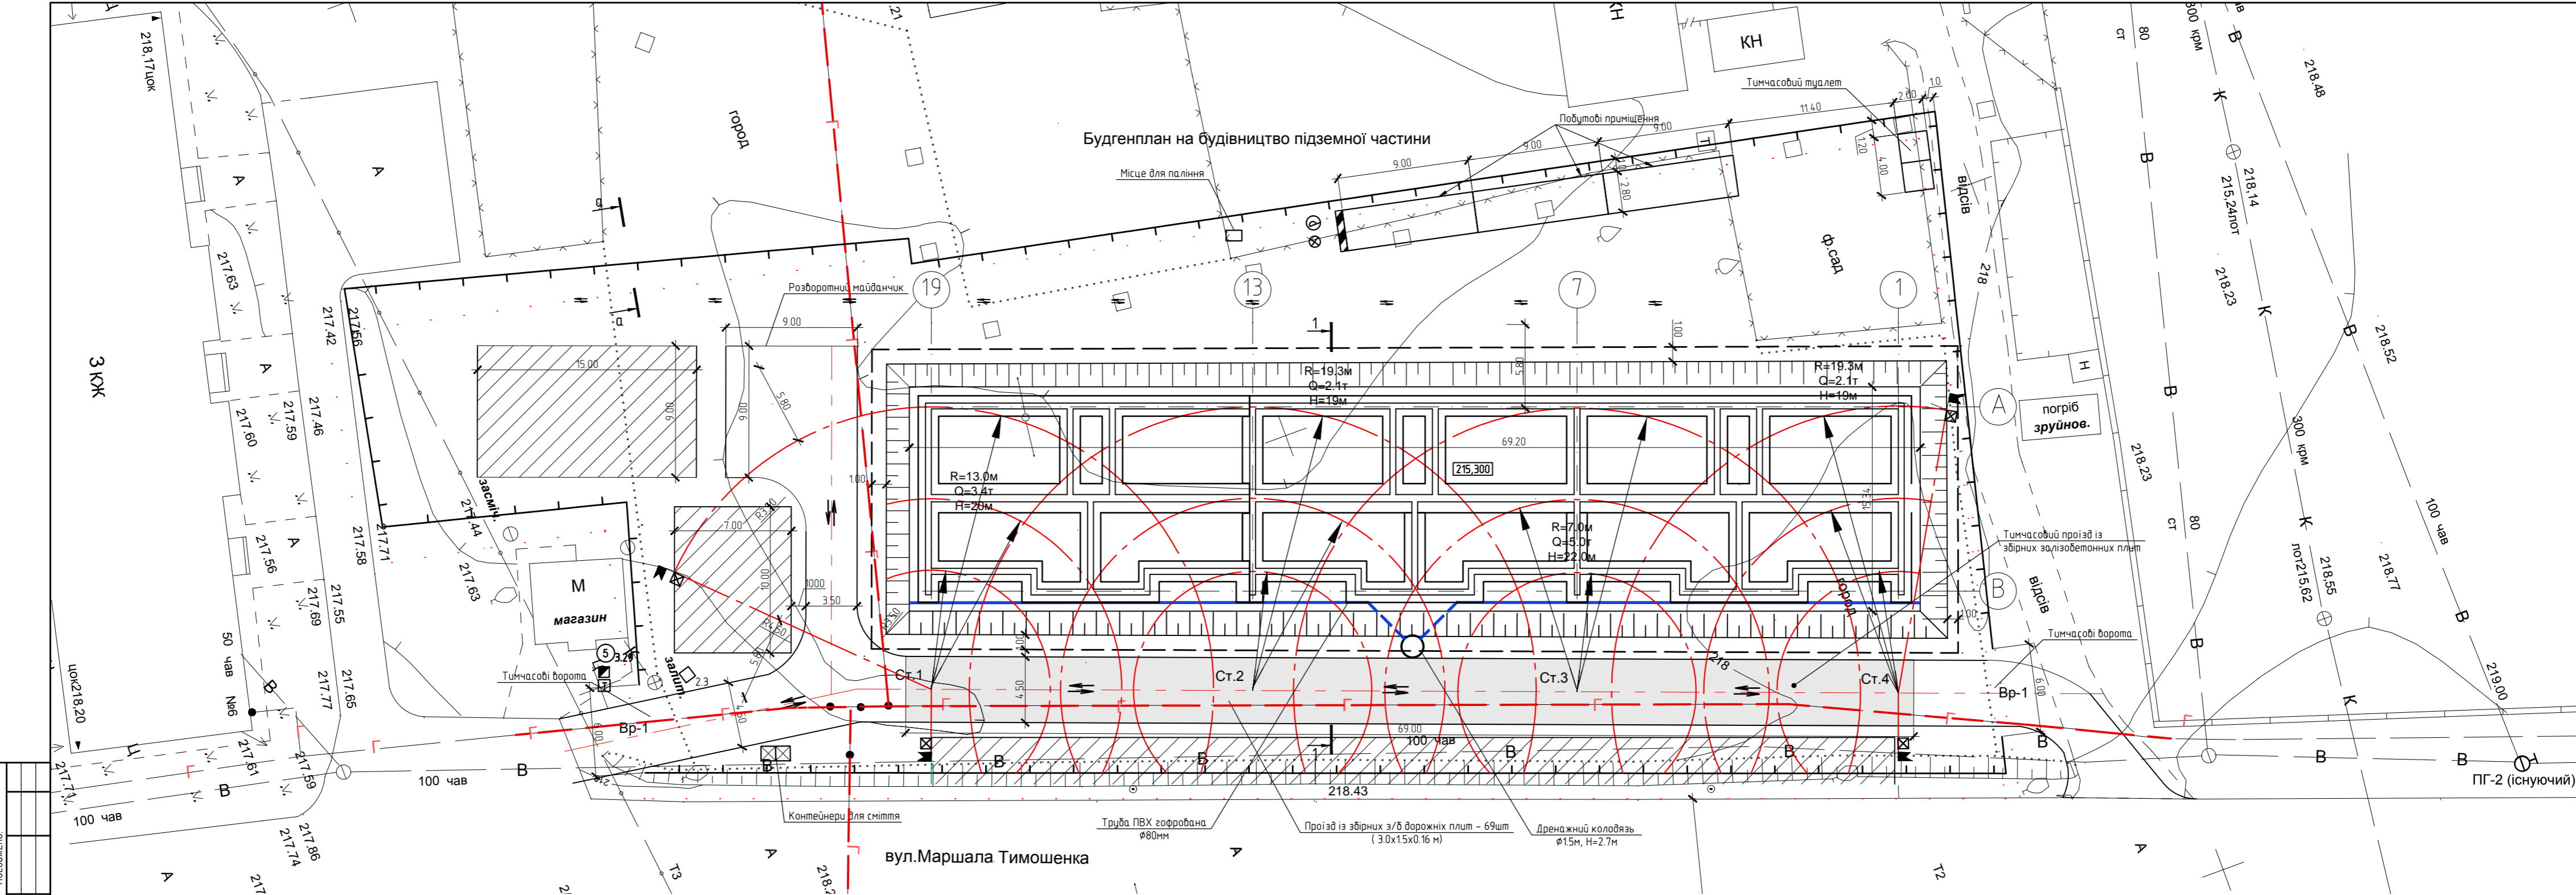

Погоджено	
Замов. №	
Листів: 1 з 1	
Формат: А2	

Знак обмеження дії крану "Зебра"

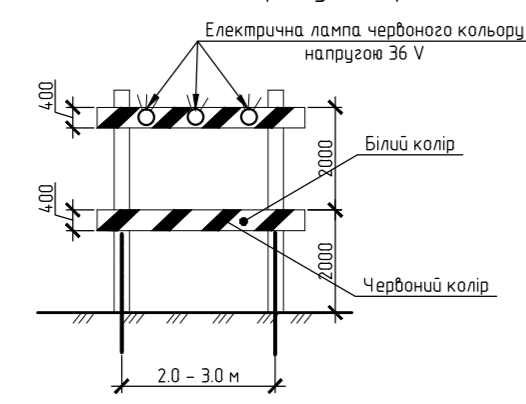

- 1 - стійка огорожі (брусок 100x100)
- 2 - щити з дошки t=20мм
- 3 - панель козирка (дошка t=15мм)
- 4 - ригель (брусок 80x80)
- 5 - підвіс козирка (дошка t=30мм)

вул. Маршала Тимошенка

Умовні позначення:
- діючий газопровід низького тиску $\phi 150$ мм

УВАГА!!! При проведенні будівельно-монтажних робіт виконати всі заходи для запобігання пошкодження газопроводу

Примітки:
Під час будівництва зовнішнє пожежогасіння здійснюється з існуючого пожежного гідранта ПГ-2, який встановлений на місцевих закільцьованих мережах водопроводу.
В подальшому запроєктовано пожежний гідрант ПГ-1 (дивись проект 123-00-ЗВК), який встановлюється на запроєктованій мережі водопроводу В1.

					2015	123-00-ПВР			
						Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Тимошенка, 2			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ок.	Підпис	Дата	Будівництво чотирьохповерхового житлового будинку з мансардним поверхом	Стадія	Аркуші	Аркуші
Г.АП		Мельничук					РП	3	
Перевірів		Мельничук				Будгенплан на будівництво підземної частини			
Розробив		Вергелюк							
Н.контр.		Бриняк							

